



0. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ LEVÉHO JÍZDNÍHO PRUHU DO STŘEDNÍHO DĚLÍČÍHO PÁSU
12 týdnů

- provizorní rozšíření levého jízdního pásu směrem k ose komunikace v LJP
- převedení dopravy na zpevněnou krajnici
- demontáž stávajících portálů v LJP
- výstavba přejezdů v SDP

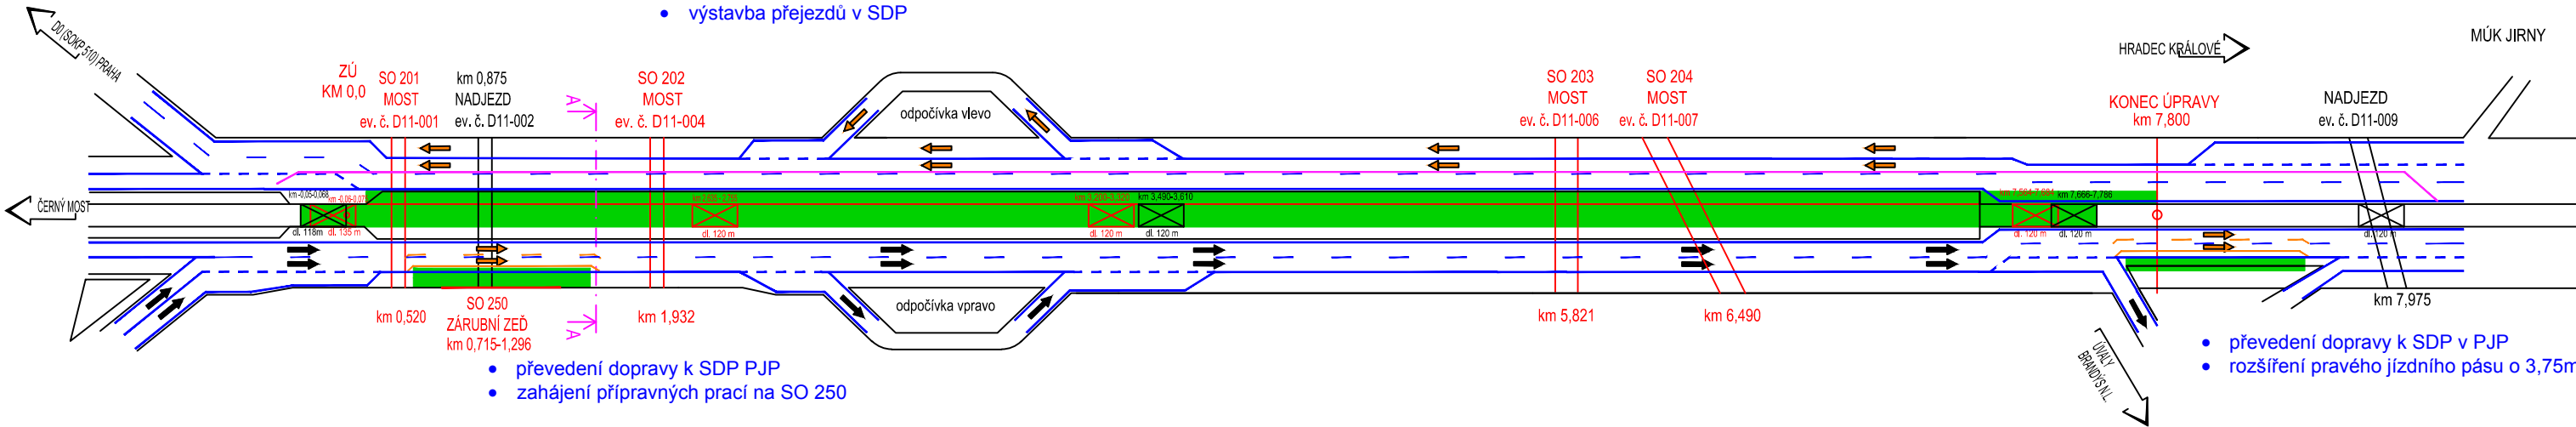


ŘEZ A


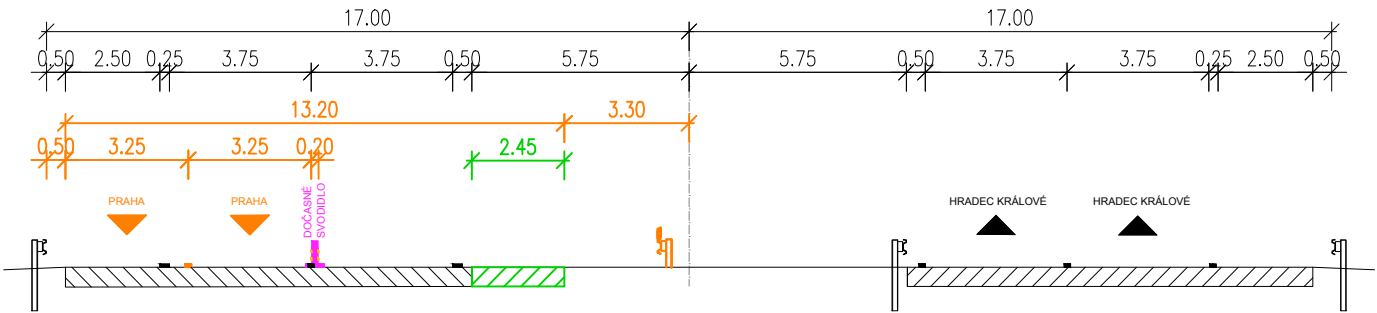


1.A ETAPA - VÝSTAVBA PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU
14 týdnů

- oprava pravého jízdního pásu D11 (vozovka, odvodnění, mosty)
- převedení dopravy do levého jízdního pásu (provoz 2+2)
- položení kabelů SOS do středního dělicího pásu
- oprava vozovky pravé odpočívky
- výstavba středové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,300
- rekonstrukce opěrné zdi v LJP km cca 1,0

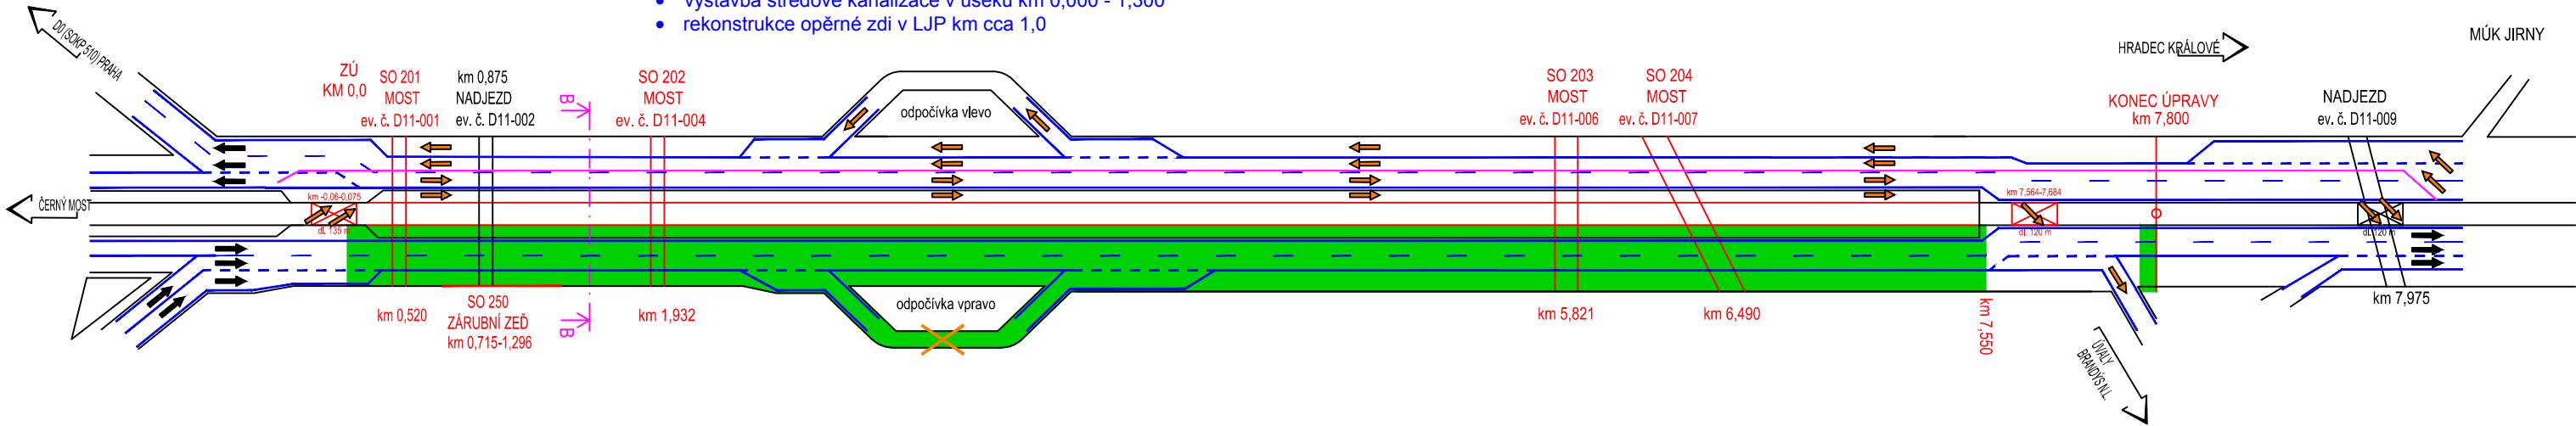


ŘEZ B

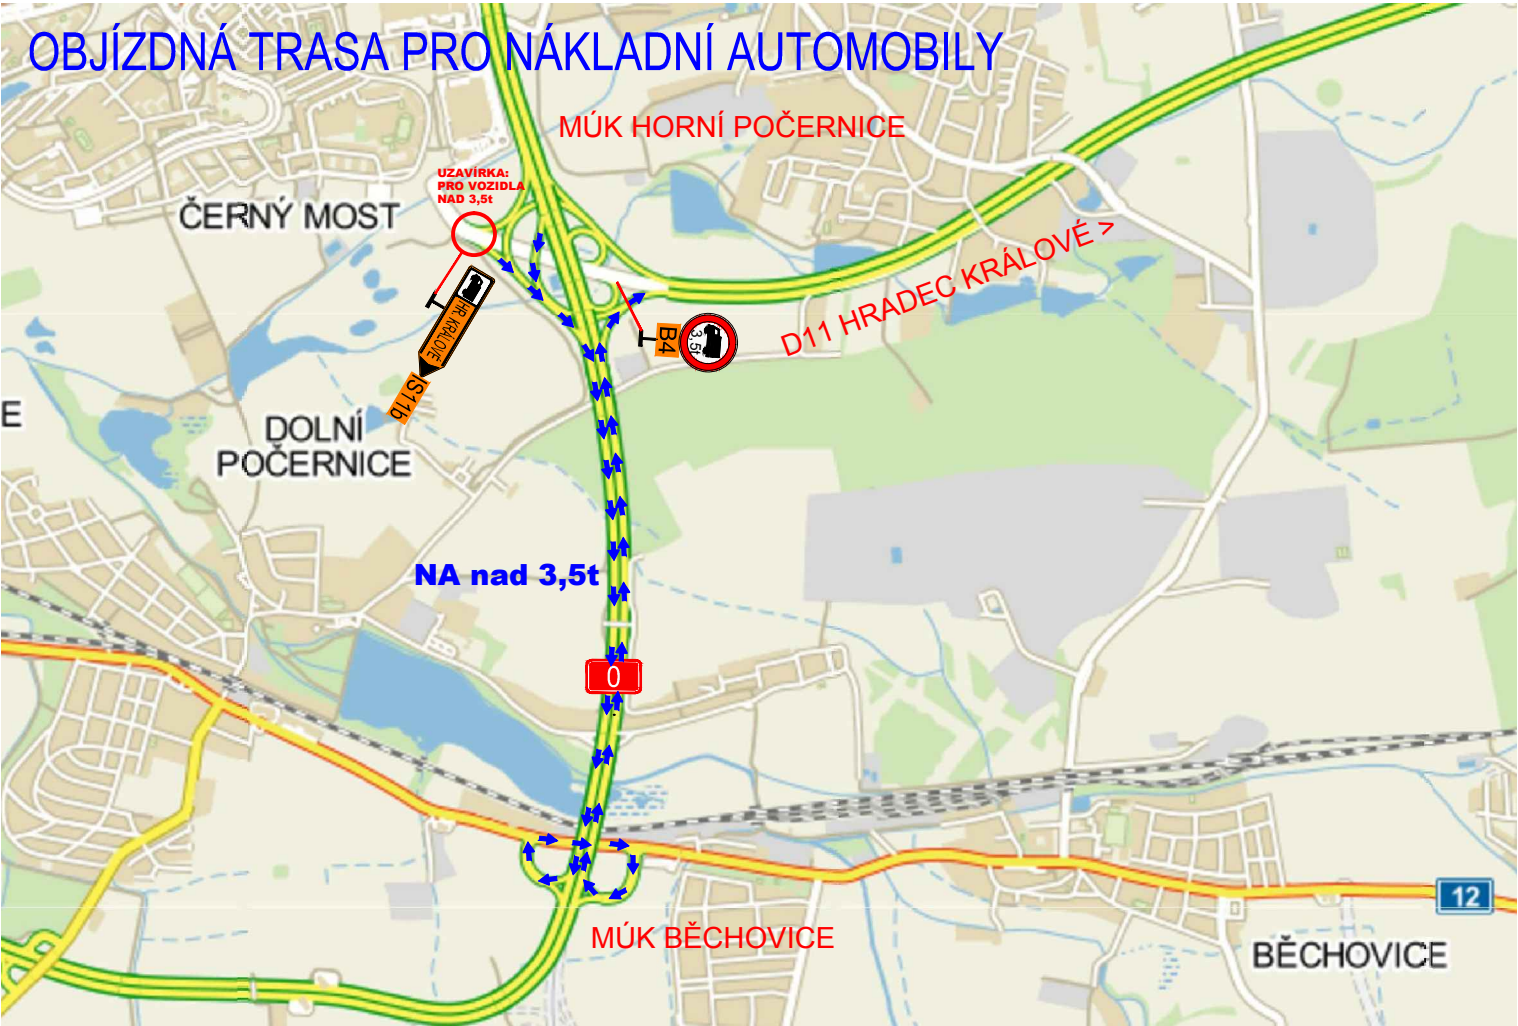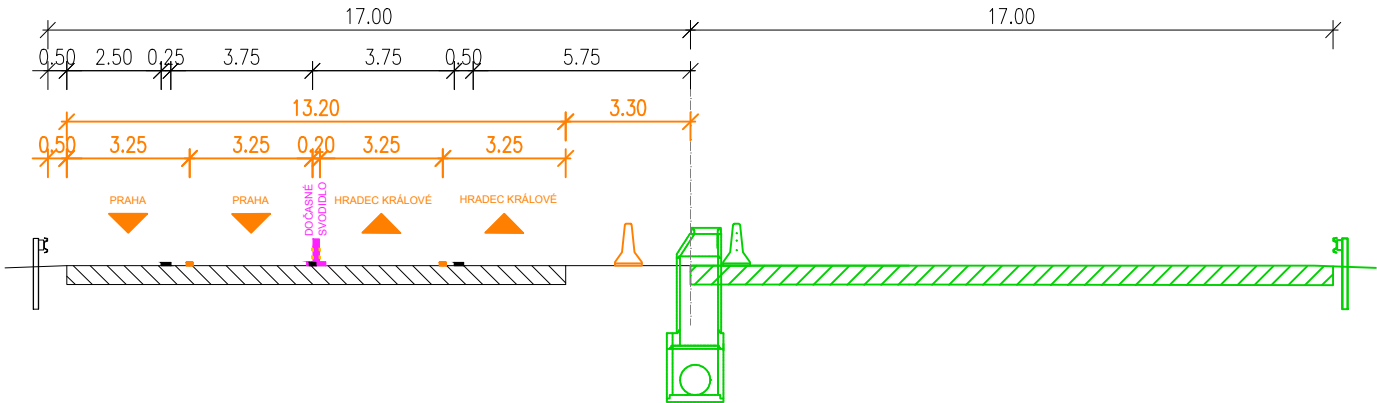


1.B ETAPA - VÝSTAVBA PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

11 týdnů

- dokončení kompletní opravy pravého jízdního pásu D11
- po dobu výstavby povrchu vozovky v km 7,550 - 7,800 bude zavřen výjezd od Prahy
- objíždňá trasa bude vedena přes další MÚK v km 18

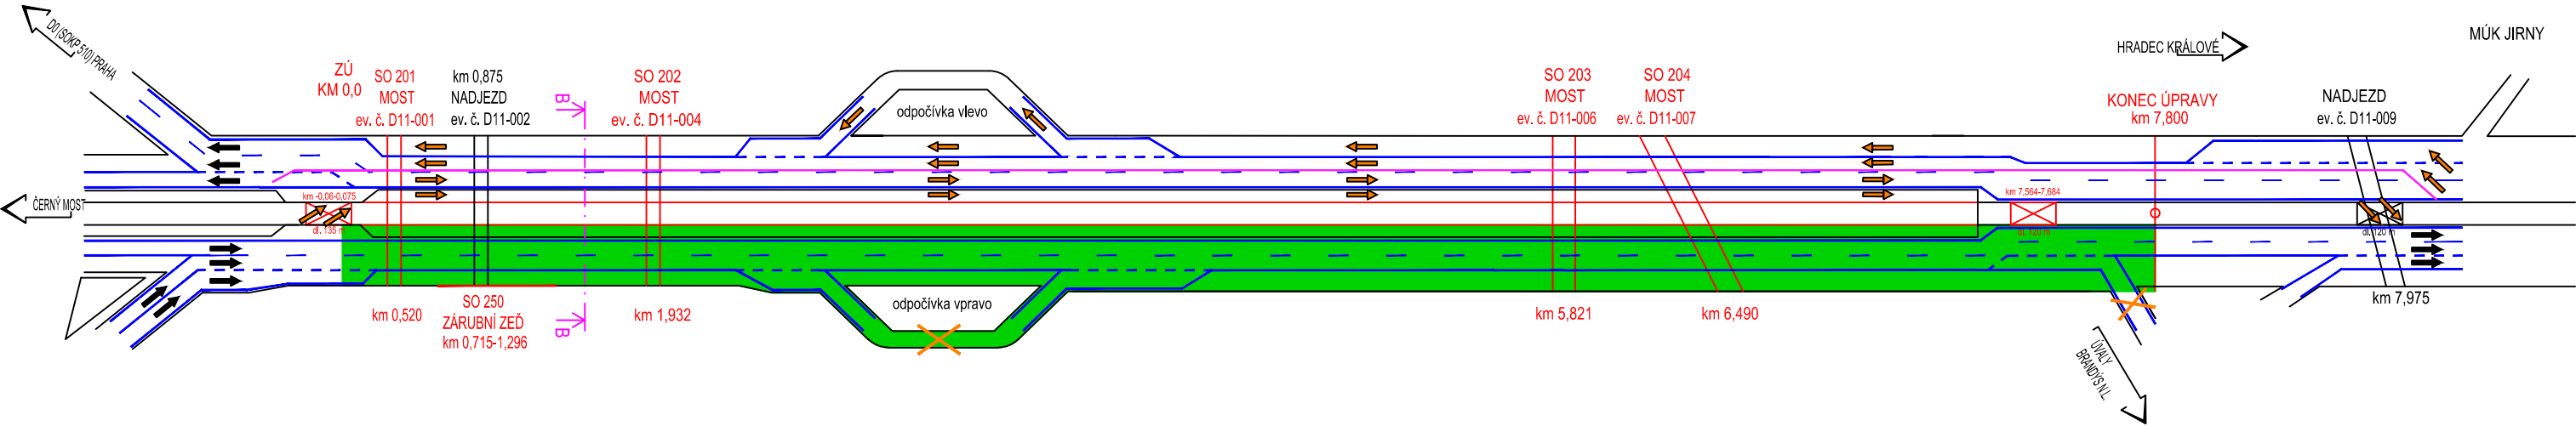


ŘEZ B

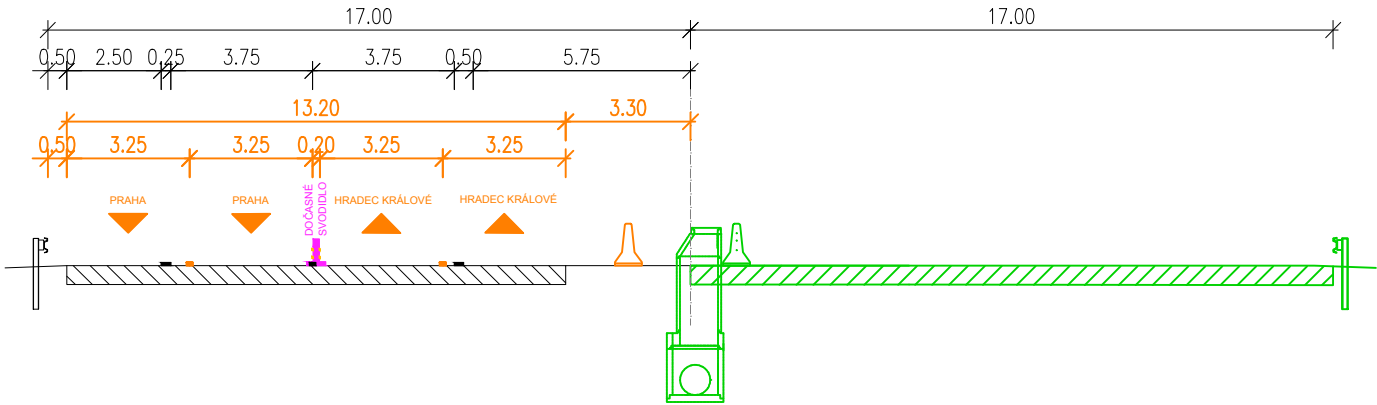

2. ETAPA - VÝSTAVBA LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU

25 týdnů

- oprava levého jízdního pásu D11 (vozovka, odvodnění, mosty)
- převedení dopravy do pravého jízdního pásu (provoz 2+2)
- oprava vozovky levé odpočívky
- realizace betonového levého svodidla
- definitivní výstavba přejezdů středního dělicího pásu

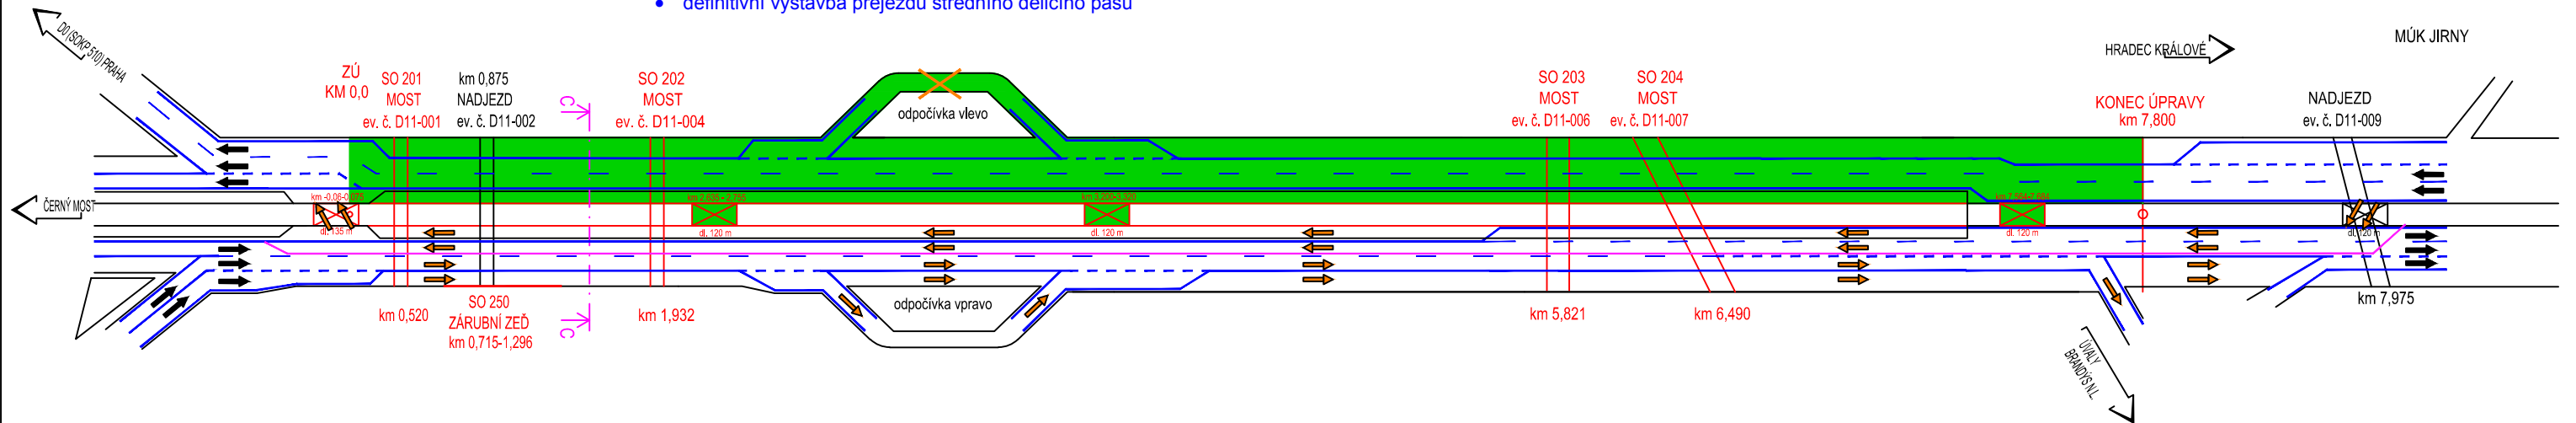

ŘEZ C

