


Postup prací:


1. Provizorní podepření střechy
Lešení
2. Odbourání atiky
Odstranění všech izolačních vrstev
Vybourání stropu pro schodiště
3. Provedení podkladů panelů
Zaizolování původní izolace fasády
4. Před položením panelů provést prostupy pro kanalizaci a pod. ve stávajícím stropě
5. Rozebrání původní střechy, po částech
Položení panelů a zálivka panelů
Provedení provizorní izolace a provizorního odvodnění
Zkrytí otvoru pro schodiště předem připraveným dřevěným krytem rozměr cca 4,6 x 6,9 m
6. Provizorní zakrytí štítů vedlejších střech

Bourání krovu

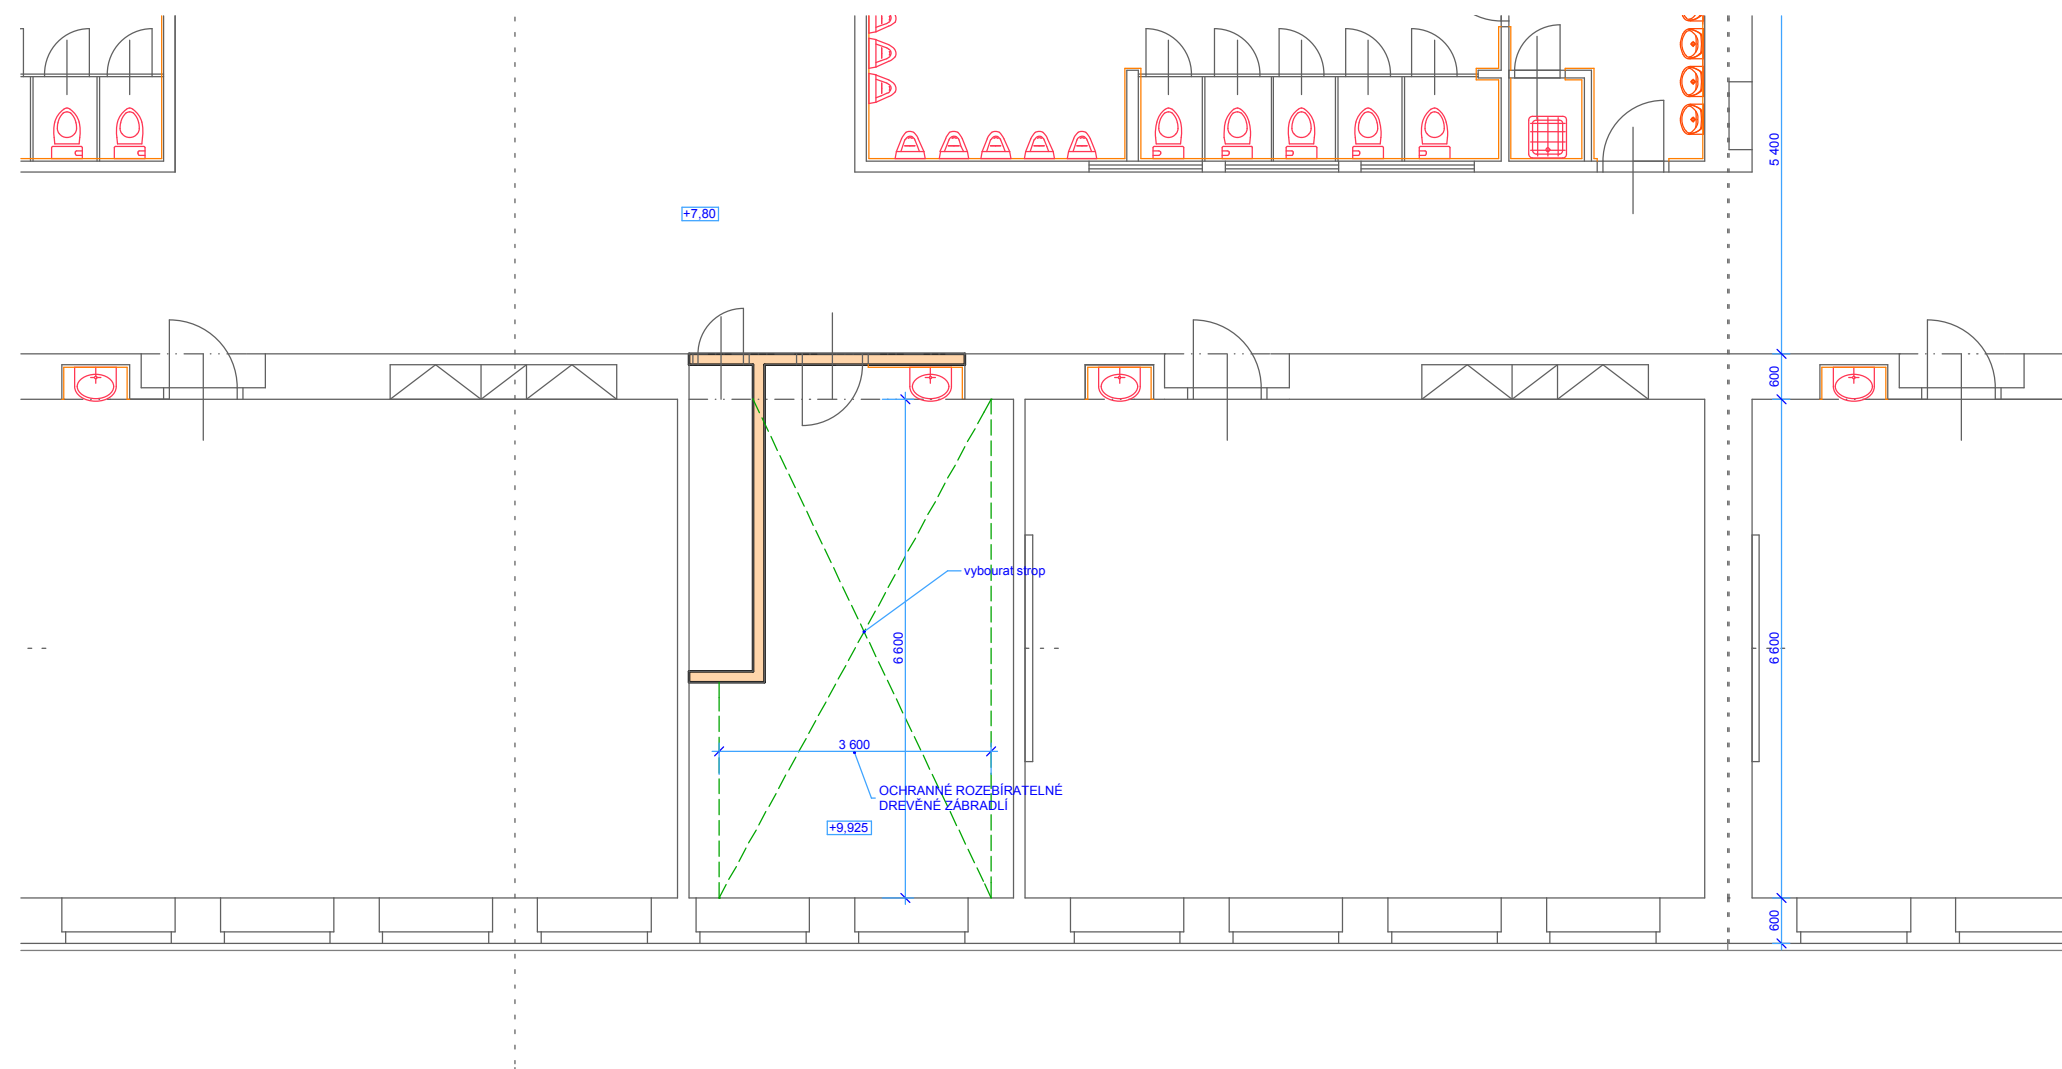

3.np - bourání

BOURÁNÍ V DALŠÍCH PODLAŽÍCH JE POPSÁNO
V JEDNOTLIVÝCH PŮDORYSECH A ŘEZECH

PROJEKTANT	ING.ARCH. JAN HASÍK			
INVESTOR	ZŠ JAKUBA ARBESA, MOST			
NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ J. ARBESA V MOSTĚ		DATUM	09/2016	
		STUPĚŇ	PDPPS.PDPVZ	
BOURÁNÍ PRO NÁSTAVBU		ZAK.	06/16	15
		MĚŘ.	1:100	
