

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 123-002 Vlásenice

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200162

číslo smlouvy objednatele: 86/P/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
Sídlo: **Brno, Veverří, Burešova 938/17, 602 00**  
Zastoupený: [REDACTED], ředitel divize Dopravní stavby  
tel.: [REDACTED]  
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:  
[REDACTED], ředitel divize Dopravní stavby

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] k

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo a tyto části zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 86/P/2018, dále **projektovou dokumentací stavby „Most ev.č. 123-002 Vlásenice“**, vypracovanou **Projekční kanceláří Pris, s.r.o.**, se sídlem **Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	5 350 464,22 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	216 658,20 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5 567 122,42 Kč
DPH 21%	1 169 095,71 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	6 736 218,13 Kč

**slovy: šestmilionůsedmsetřicetšesttisícdvěstěosmnáct korun českých 13/100 včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha: Změnový list č. 1**

Za objednatele: 20 -11- 2018  
České Budějovice, dne:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele: OHL ŽS, a.s.  
V Brně, dne: 20 -11- 2018

Petr Zbraněk  
ředitel divize Dopravní stavby

**OHL ŽS**

150

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

<b>Stavba:</b>	Most ev.č. 123-002 Vlášenice	č. SOD objednatele:	86/P/2018
<b>Objekt:</b>	SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce SO 182 - Dopravně inženýrská opatření SO 201 - Most ev.č. 123-002	š. SOD zhotovitele:	SOD00200162
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
<b>TDS:</b>	I. [redacted] náměstí Republiky 104, 392 01 Soběslav		
<b>Projektant:</b>	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno - Starý Lískovec		
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří		
<b>Předmět změny:</b>	SO 201, SO 182 1..2. Zrušení skládky, která byla uvažována v zadávací dokumentaci (vzhledem ke kapacitám již odpady nepřijímá) - navýšení dopravy stavebního odpadu na skládku.		
<b>Návrh ocenění:</b>	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
1. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm		1 800,00
Bourání nábrežní kamenné zidky, dopočítání km			
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm		30 556,80
Bourání konstrukce mostu, dopočítání km			
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm		82 235,28
Výkopy u opěr, dopočítání km			
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm		1 620,00
Pročištění a urovnání dna koryta pod mostem a v okolí mostu, dopočítání km			
2. ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5 KM - DOPRAVA	tkm		10 546,20
Odstranění vrstvy 10 cm z mostu a předpolí, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm		11 491,20
Odstranění podkladní vrstvy vozovky, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5 KM - DOPRAVA	tkm		2 728,80
Odstranění provizorní komunikace, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm		17 803,80
Odstranění podkladní vrstvy vozovky, dopočítání km			
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm		57 876,12
Výkopy pro odtěžení násypu pro provizorium, dopočítání km			
<b>Celkem bez DPH</b>			216 658,20 Kč
<b>DPH 21%</b>			
<b>Podpis navrhovatele:</b>	Datum:		
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
<b>TDS:</b>	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>	ING. JAN ŠTÍPÁNEK	datum:	podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b>	Vlášenice_cenový položkový rozpis Přehled skládek Vyjádření skládky v Jistebnici		



## Návrh na změnový list

Stavba: Most ev.č. 123-002 Vlášenice  
 Objekt: SO 201 MOST  
 Rozpočet: Most ev.č. 123-002

201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>2 Vícepráce</b>							
43	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm			1 800 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
44	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm			30 558 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
7	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	tkm			82 235 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
6	124734		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	tkm			1 620 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
2	113334		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	tkm			10 546 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
1	113324		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	tkm			11 491 Kč
			doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
<b>2 SO201 Vícepráce celkem</b>							<b>138 251 Kč</b>

DOPRAVA 5\*2\*15 150 tkm

DOPRAVA 84,883\*2\*15 2546,49 tkm

DOPRAVA 253,812\*1,8\*15 6852,924 tkm

DOPRAVA 5\*1,8\*15 135 tkm

DOPRAVA 27,9\*2,1\*15 878,85 tkm

DOPRAVA 30,4\*2,1\*15 957,6 tkm

Most ev.č. 123-002 Vlásenice					182	
SO 182 Dopravné inženýrská opatření						
2		Vícepráce				
1	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	tkm			2 729 Kč
		doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
2	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	tkm			17 804 Kč
		doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
3	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	tkm			57 876 Kč
		doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny				
2		SO182 Vícepráce celkem				78 409 Kč
2		Vícepráce celkem				216 659 Kč

DOPRAVA 14,438\*2,1\*15\*0,5 227,3985 tkm

DOPRAVA 47,1\*2,1\*15 1483,65 tkm

DOPRAVA 178,63\*1,8\*15 4823,01 tkm

CS road construction s.r.o.

IČ: 022 17 791  
 DIČ: CZ 022 17 791

Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.  
 Osová 20, 625 00 Brno  
 IČ: 46 97 48 06  
 DIČ: CZ46974806

2

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**SÚS Jihočeského kraje p.o.**

[REDACTED]

**Nemanická 10**

**370 10 České Budějovice**

Naše značka  
D/S- 2533/2018 - Řeh

Zakázka č.  
AD18022

Vyřizuje

[REDACTED]

Datum

7. 11. 2018

Akce: **Most ev.č. 123-002 Vlášenice**

Věc: **Stanovisko AD ke změnóvému listu 1**

Zhotovitel předložil změnóvý list, který se týká navýšení tunokilometrů kvůli změně skládky. Jako AD stavby s tímto změnóvým listem souhlasím, protože skládka uvažovaná v zadávací dokumentaci již odpady nepřijímá a bylo nutno odpad odvést na vzdálenější skládku. Tyto skutečnosti zhotovitel řádně zdůvodnil a dokladoval.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

S pozdravem

[REDACTED]

tel.: 547 212 053

[REDACTED]

web: [www.pris.cz](http://www.pris.cz)

e-mail: [jmeno.prijmeni@pris.cz](mailto:jmeno.prijmeni@pris.cz)

Bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú.

[REDACTED]


IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

## PŘEHLED SKLÁDEK

Akce: Most ev.č. 123-002 Vlásenice

Skládka	Vzdálenost od stavby	Poznámka
Jistebnice	5 km	Skládka uvažovaná v zadávací dokumentaci v současné době stavební odpad nepřijímá.
Chotoviny	20 km	Skládka, na kterou je odpad ze stavby odvážen.
Planá nad Lužnicí	22 km	-
Votice	30 km	-

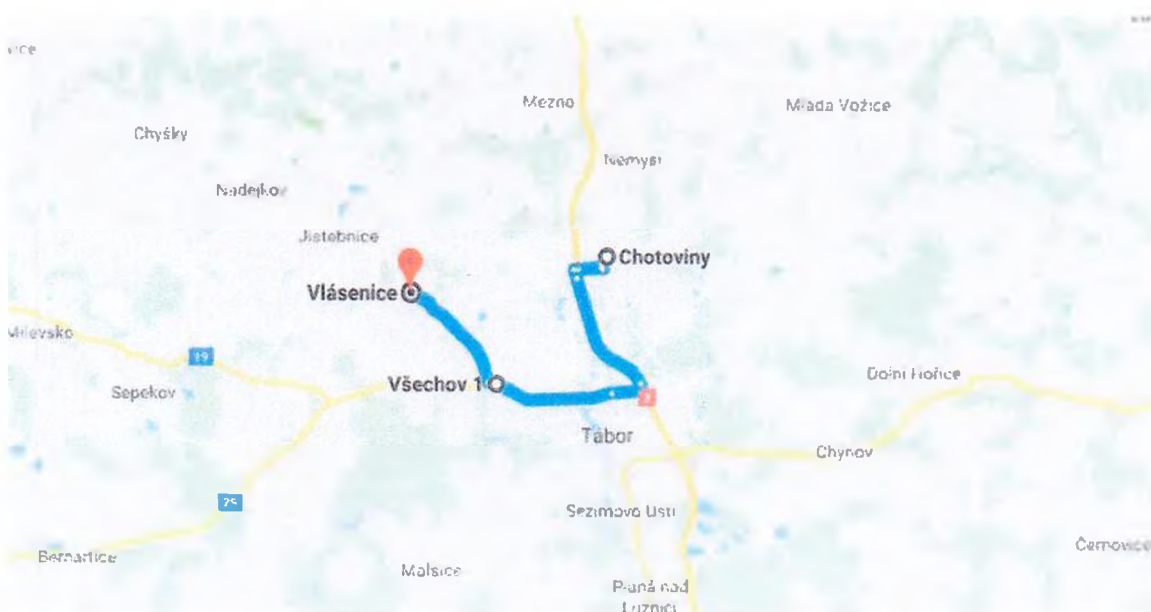

Trasa dopravy stavebního odpadu vzniklého při rekonstrukci mostu v obci Vlásenice.

Jiné alternativní trasy na skládku není možné použít kvůli nevhodnému šířkovému uspořádání komunikace pro nákladní automobily.

**Město Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice**

**Tel.: 381 273 301, 381 273 331**

**E-mail: obec@jistebnice.cz**

**dat. schránka: dvibdsi**

Vyřizuje: [redacted]  
Naše značka: č.j.: OBJI/1469/2018

V Jistebnici dne: 30.10.2018

**OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 938/17**  
**část obce Veverčí**  
**602 00 Brno**

**Věc: Potvrzení**

Město Jistebnice, zastoupené starostou města [redacted] IČO 002 52 425,  
**p o t v r z u j e**, že na skládku TKO Jistebnice nebude přijímán žádný odpad ze stavební akce  
s názvem „Most ev. č. 123-002 Vlásenice“ z důvodu nedostatečné kapacity skládky.

S pozdravem

[redacted]  
[redacted]  
starosta města Jistebnice

**MĚSTO JISTEBNICE** 12)  
391 33 Jistebnice  
ČS TABOR 701497339/U500  
tel.: 381 273 301, fax: 381 273 366  
IČO: 002 52 425  
DIČ: CZ00252425

Obdrží:

**OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverčí**



EVIDENČNÍ ČÍSLO	2018-01 VL/06	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVIL	1
		VÝTISK ČÍSLO	
		KLASIFIKACE	PI

SUS JK  
Ing. Jan Šticha  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

## Most ev.č. 123-002 Vlášenice, TDI

### Stanovisko TDI k ZBV 1

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 1, které obsahuje tyto změny:

- 1) Náklady spojené s větší dojezdovou vzdáleností na skládku

Je následující:

Po technické stránce bez připomínek, změna reaguje na aktuální stav, kdy původně předpokládaná skládka není již funkční (již nepřibírá materiál, toto je doloženo vyjádřením starosty obce města Jistebnice), a tak je nutné umístit předmětný odpad ze stavby na nejbližší jinou skládku (Chotoviny), změna tak obsahuje cenové navýšení formou příplatku za dopravu na větší vzdálenost (dopočtení ceny za větší vzdálenost, oproti předpokladům PDPS – skládka do 5 km).

Tato skutečnost mohla být zjištěna až během realizace samotných stavebních prací, kdy se zhotovitel pokusil uložit odpad na skládku, která byla předpokládaná v PDPS. Tato skládka však již nepřijímá další odpad, proto zhotovitel byl nucen uložit odpad ze stavby na nejbližší jinou skládku. Tuto skutečnost Objednatel nemohl předpokládat, neboť mohla být zjištěna až během samotného provádění stavebních prací.


Zhotovitel proto nároku jen příplatek za větší vzdálenost v km než byl předpoklad zadání (skládka do 5 km).

TDI se změnou souhlasí.

V Soběslavi dne 5.11.2018

Rozdělovník:

- 1) SUS JK



CS ROAD CONSTRUCTION S R O,	STANOVISKO TDI K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2018-01 VL/06	NÁZEV STAVBY: MOST EV.Č. 123-002 VLÁŠENICE	SUS JK
	KLASIFIKACE: PROVOZINÍ INFORMACE	STRANA: 1/1
